


Examen parcial 092

Nombre: _____


1. [10%] De acuerdo al diagrama y a lo estudiado en el PMBoK defina el concepto “Lecciones aprendidas”

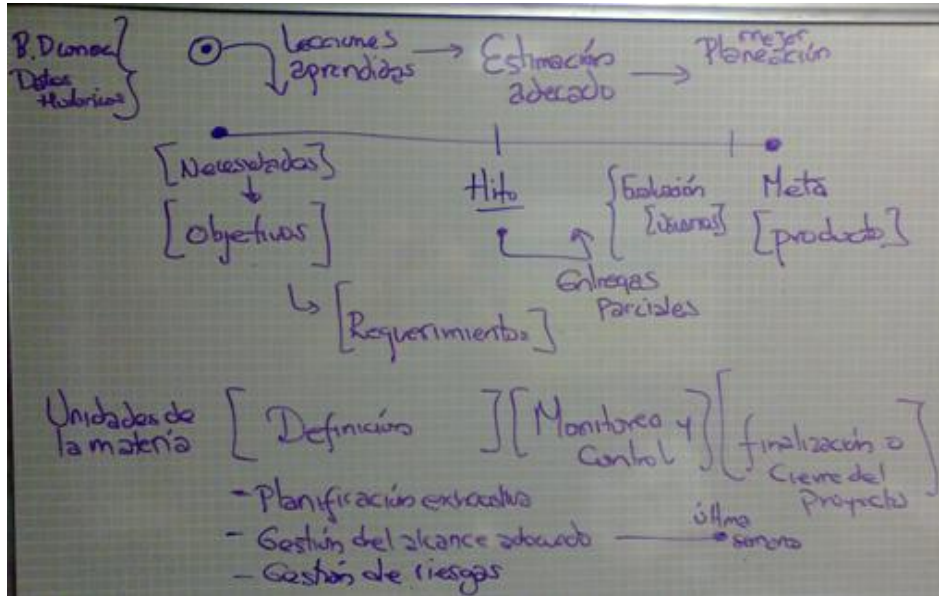

2. [10%] ¿Para gestionar el alcance de un proyecto se requiere?
- Planificación del alcance, definición del alcance, crear EDT, verificación del alcance y control del alcance
 - Planificación del alcance, definición del alcance, crear EDT, verificación del alcance, control del alcance y presentación del informe final
 - Planificación del alcance, crear EDT, verificación del alcance y control del alcance
 - Planificación del alcance, definición del alcance y control del alcance
3. [10%] En paquete de trabajo es:
- Una tarea con un identificador único
 - Un entregable al más bajo nivel
 - Un conjunto de actividades críticas
 - Ninguna de las anteriores

4. [10%] A partir la información que se presenta a continuación indique la ruta crítica:

	i	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	27 sep '09							04 oct '09							11 oct '09								
								S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X	J	V	S	S	D	L	M	X		
1																														
2																														
3		A	2 horas	lun 28/09/09	lun 28/09/09		R1																							
4		B	20 horas	lun 28/09/09	mié 30/09/09	3	R2																							
5		C	3 horas	mié 30/09/09	jue 01/10/09	4	R2																							
6		D	8 horas	lun 28/09/09	mar 29/09/09	3	R1																							
7		E	12 horas	mar 29/09/09	mié 30/09/09	6	R1																							
8		F	6 horas	jue 01/10/09	jue 01/10/09	7,5	R1																							
9		G	12 horas	jue 01/10/09	lun 05/10/09	8	R2																							
10		H	10 horas	lun 05/10/09	mar 06/10/09	9	R1																							

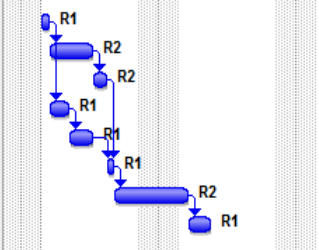

Ruta crítica: _____

5. [30%] Una organización requiere el desarrollo de un sistema de información utilizando como herramientas SQL, PL/SQL, Forms y Reports, para lo cual lo ha contratado para **elaborar el plan de trabajo** que tome el menor tiempo posible basándose en las habilidades de su personal.

Para ello le ha entregado la siguiente información:

Tiempo en horas por herramienta y complejidad									
Forms			Reports			SQL y PL/SQL			
Recurso	FC1	FC2	FC3	RC1	RC2	RC3	SC1	SC2	SC3
R1	4	10	25	3	8	19	4	12	15
R2	3	11	20	3	11	25	3	10	12
R3	4	10	20	3	13	23	4	10	12

Cantidad de objetos x herramienta y complejidad									
Forms			Reports			SQL y PL/SQL			
FC1	FC2	FC3	RC1	RC2	RC3	SC1	SC2	SC3	
10	5	2	0	10	5	4	8	20	

6. [30%] Elabore el plan de riesgos para el proyecto de 4GL utilizando el formato de plan de riesgos del curso de gerencia de proyectos. Utilizar los formatos que se encuentra en Moodle para el curso.
